

# Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:  
**Statutární město  
Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO A: Dopravní část**

## Popis změny, technického řešení:

### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Ve vozovce byl předpokládán stávající asfaltobetonový kryt o tl 100 mm, určený k vybourání.

### Nové řešení:

Asfaltobetonový kryt ve vozovce byl tloušťky prům. 200 mm a pod ním se nacházela další vrstva podkladního betonu prům. tloušťky 100 mm, se kterým PDPS neuvažovala. Tyto vrstvy byly vybourány. O navýšenou tloušťku bouraných asfaltobetonových a betonových vrstev bylo poníženo množství odtěžené zeminy pod vozovkou.

### Zdůvodnění změny:

Pro provedení rekonstrukce bylo odstranění stávajícího živičného krytu a podkladního betonu nezbytné.

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Beze změny.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Beze vlivu na termín a kvalitu. Předpokládané navýšení ceny o 148 092,44 Kč bez DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“

---

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

Datum:

Podpis:



## Ocenění ke změně č. 1

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

1 /

název části stavby (stavební objekt):

SO A: Dopravní část

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<b>Nové položky</b>						
	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	680,000	109,00	74 120,00
	113107244	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	680,000	106,00	72 080,00
<b>Celkem:</b>						<b>146 200,00</b>
<b>Odstraněné položky</b>						
	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-680,000	25,04	-17 027,20
<b>Celkem:</b>						<b>-17 027,20</b>
<b>Změněné položky</b>						
	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	-136,000	70,51	-9 589,36
	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-136,000	186,24	-25 328,64
	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklázky	m3	-136,000	13,29	-1 807,44
	17120120R	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-204,000	93,60	-19 094,40
	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	340,000	27,87	9 475,80
	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 060,000	6,56	20 073,60
	99722110R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	163,200	175,50	28 641,60
	99722120R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	176,800	93,60	16 548,48
<b>Celkem:</b>						<b>18 919,64</b>
<b>Celkem - : „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“</b>						<b>148 092,44</b>

Celkem včetně DPH 21 %

179 191,85

Celkem včetně DPH 21 %

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Projektant: BPO spol. s r. o.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

TDI: BURETAS s.r.o.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:  
**Statutární město  
Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO A: Dopravní část**

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

PDPS předepisovala odvodnění pláně trativody zaústěnými do kanalizace.

#### Nové řešení:

Trativody nebudou provedeny.

#### Zdůvodnění změny:

Vzhledem k výskytu velkého množství podzemních inženýrských sítí, a zvláště pak z důvodu výškové i směrové kolize plánované trasy drenáže se současnou polohou STL plynového potrubí, nebudou trativody provedeny.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude zakresleno v DSPS.

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Beze vlivu na termín a kvalitu. Předpokládaná úspora o 53 505,73 Kč bez DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 2

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“

---

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

Datum:

Podpis:

## Ocenění ke změně č. 2

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

2 /

název části stavby (stavební objekt):

SO A: Dopravní část

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<b>Nové položky</b>						
						0,00
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>
<b>Odstraněné položky</b>						
	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-20,000	570,42	-11 408,40
	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	-145,000	107,16	-15 538,20
	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného	m3	-2,500	980,45	-2 451,13
	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	-15,000	1 153,96	-17 309,40
<b>Celkem:</b>						<b>-46 707,13</b>
<b>Změněné položky</b>						
	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-20,000	186,24	-3 724,80
	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-20,000	13,29	-265,80
	17120120R	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-30,000	93,60	-2 808,00
<b>Celkem:</b>						<b>-6 798,60</b>
<b>Celkem - „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“ :</b>						<b>-53 505,73</b>

<b>Celkem včetně DPH 21 %</b>	<b>-64 741,93</b>
Celkem včetně DPH 21 %	

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Projektant: BPO spol. s r. o.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

TDI: BURETAS s.r.o.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:  
**Statutární město  
Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO A: Dopravní část**

### Popis změny, technického řešení:

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

PDPS neřešila realizaci chodníku podél panelového domu č.p. 1170/11.

**Nové řešení:**

Chodník bude proveden shodně s ostatními chodníky v rekonstruované části ulice.

**Zdůvodnění změny:**

Část chodníku výškově nekoresponduje s novou niveletou vozovky.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Bude zakresleno v DSPS.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Beze vlivu na termín a kvalitu. Předpokládané navýšení ceny o 41 930,28 Kč bez DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 3

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“

---

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatel**

Datum:

Podpis:



smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<b>Nové položky</b>						
		obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	12,000	85,00	1 020,00
<b>Celkem:</b>						<b>1 020,00</b>
<b>Odstraněné položky</b>						
						0,00
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>
<b>Změněné položky</b>						
	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	1,300	70,51	91,66
	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,260	250,30	65,08
	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	1,300	186,24	242,11
	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,300	13,29	17,28
	17120120R	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,950	93,60	182,52
	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	26,000	18,41	478,66
	57713311R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	26,000	238,90	6 211,40
	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm	m2	26,000	56,90	1 479,40
	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	26,000	176,35	4 585,10
	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,080	403,83	5 685,93
	58380207	krajník kamenný žulový silniční 160x200x300-800mm	m	15,000	682,11	10 231,65
	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,030	331,66	3 658,21
	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	28,000	70,21	1 965,88
	113107241	Odstranění podkladu živinového tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	26,000	17,31	450,06
	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	26,000	73,51	1 911,26
	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	14,980	27,87	417,49
	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	134,820	6,56	884,42
	99722110R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	11,600	175,50	2 035,80
	99722120R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,380	93,60	316,37
<b>Celkem:</b>						<b>40 910,28</b>
<b>Celkem - „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“ :</b>						<b>41 930,28</b>

<b>Celkem včetně DPH 21 %</b>	<b>50 735,63</b>
Celkem včetně DPH 21 %	

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Projektant: BPO spol. s r. o.

Objednatel: Statutární město Ka

TDI: BURETAS s.r.o.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:  
**Statutární město  
Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO A: Dopravní část**

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

PDPS předpokládala částečné ubourání vrchní části anglických dvorků, následné nové provedení této části ze ŽB a osazení nových mříží a poklopů, dle stávajícího stavu.

#### Nové řešení:

Opravu anglických dvorků u č.p. 10 a 12 provede vlastník nemovitosti na své náklady. U ostatních anglických dvorků byl shledán dobrý technický stav a provede se tedy pouze výměna mříží/poklopů, nebo částečná oprava vrchní části dvorků ze ŽB v souladu s PDPS.

#### Zdůvodnění změny:

Vzhledem k zastiženému velmi špatnému technickému stavu nosných konstrukcí anglických dvorků u č.p. 10 a 12, je nutná rozsáhlejší a technologicky komplexnější oprava těchto objektů. Z tohoto důvodu byla vyvolána jednání s vlastníky objektů a bylo dohodnuto, že opravu zajistí vlastníci domů. Z důvodu časově náročné koordinace a vleklých jednání ohledně těchto objektů, dochází k mírnému prodloužení termínu dokončení díla.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude zakresleno v DSPS.

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Prodloužení termínu dokončení do 15.11.2021, tj o 23 dní. Bez vlivu na kvalitu. Předpokládaná úspora ve výši 138 655,90 Kč bez DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 4

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“


---

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

Datum:

Podpis:



## Ocenění ke změně č. 4

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

4 /

název části stavby (stavební objekt):

SO A: Dopravní část

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<b>Nové položky</b>						
						0,00
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>
<b>Odstraněné položky</b>						
						0,00
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>
<b>Změněné položky</b>						
	27432251R	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 XF4	m3	-13,100	3 742,72	-49 029,63
	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	-74,850	349,34	-26 148,10
	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	-74,850	65,86	-4 929,62
	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	-13,100	1 265,79	-16 581,85
	76700010R	Demontáž ocelových roštů (mříží) anglických dvorků včetně rámu	m2	-30,600	303,03	-9 272,72
	76700020R	Demontáž ocelových poklopů anglických dvorků včetně rámu	m2	-2,000	166,84	-333,68
	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-31,440	27,87	-876,23
	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-282,960	6,56	-1 856,22
	99722110R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	-31,440	175,50	-5 517,72
	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-31,440	41,32	-1 299,10
	767510111	Montáž osazení kanálového krytu	t	-1 120,400	19,81	-22 195,12
	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	-1,160	530,95	-615,90
<b>Celkem:</b>						<b>-138 655,90</b>
<b>Celkem - „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“ :</b>						<b>-138 655,90</b>

<b>Celkem včetně DPH 21 %</b>	<b>-167 773,63</b>
<b>Celkem včetně DPH 21 %</b>	

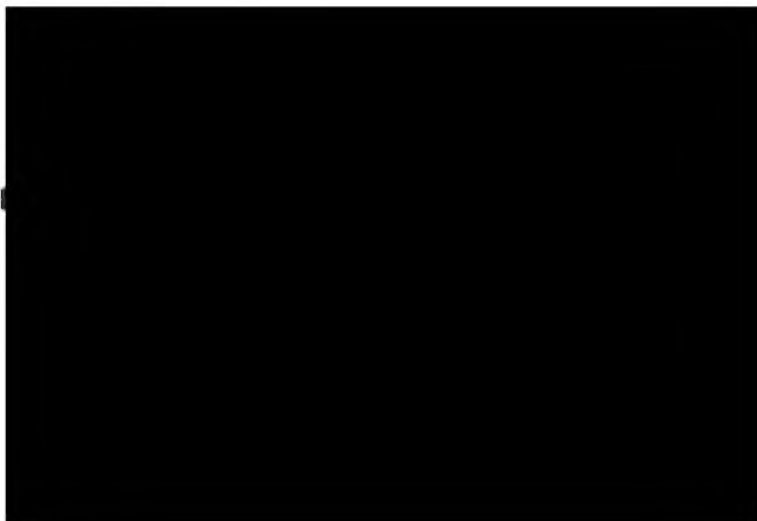
V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

Projektant: BPO spol. s r. o.

Objednatel: Statutární město Karl

TDI: BURETAS s.r.o.



## Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:  
**Statutární město  
Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO A: Dopravní část**

### Popis změny, technického řešení:

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

PDPS udávala předpokládané výměry vozovky.

**Nové řešení:**

Vozovka byla provedena v souladu s PDPS s minimálními odchylkami. Tyto jsou zohledněny odečtem.

**Zdůvodnění změny:**

Při realizaci díla došlo k drobné odchylce mezi navrženým a skutečně provedeným stavem co do plochy vozovky.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Beze změny.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Beze vlivu na termín a kvalitu. Předpokládaná úspora ve výši 6 623,58 Kč bez DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 5

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“

---

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření zhotovitele pro změnu projektu:**

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

Datum:

Podpis:



# Ocenění ke změně č. 5

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

5 /

název části stavby (stavební objekt):

SO A: Dopravní část

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<b>Nové položky</b>						
						0,00
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>
<b>Odstraněné položky</b>						
						0,00
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>
<b>Změněné položky</b>						
	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-5,900	229,39	-1 353,40
	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-5,900	18,37	-108,38
	565145121	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	-5,900	292,49	-1 725,69
	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	-5,900	52,77	-311,34
	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	-5,900	251,13	-1 481,67
	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-5,900	232,62	-1 372,46
	919726202	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	m2	-5,900	45,87	-270,63
<b>Celkem:</b>						<b>-6 623,58</b>
<b>Celkem - „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“ :</b>						<b>-6 623,58</b>

<b>Celkem včetně DPH 21 %</b>	<b>-8 014,53</b>
<b>Celkem včetně DPH 21 %</b>	

V Karlových Varech dne:

Zhotovitel: COLAS CZ a.s.

Projektant: BPO spol. s r. o.

Objednatel: Statutární město Ka

TDI: BURETAS s.r.o.

<b>Rekonstrukce Jízdárenská ul. K. Vary</b>		<b>Měření skutečného provedení stavby</b>	
GK Vilim		Telefon:	
Háje 52		Fax:	
Kolová 36001			
CZ			
<b>Soubor s daty projektu</b>		<b>Souřadnicový systém</b>	
Název:	D:\Tom\Synology_GKV\KVary\78_21_Jízdíren	Název:	Czech Republic
Velikost:	519 KB	Zóna:	Krovak_2018
Upraveno:	19.11.2021 9:35:37 (UTC:1)	Systém:	SJTSK_2013
Časové pásmo:	Střední Evropa (běžný čas)	Globální referenční	WGS 1984
Referenční číslo:	78/2021	Globální referenční	
Popis:	Měření skutečného provedení stavby	Geoid:	CR2005
Komentář 1:		Výškový systém:	Bpv
Komentář 2:		Kalibrovan:	
Komentář 3:			

#### Další podrobnosti k souřadnicovému systému

<b>Nastavení lokální transformace</b>			
Šířka projektu:	?	Ground měřítkový faktor:	1
Délka projektu:	?	Hodnota odsazení X:	0,00
Výška projektu:	400,00	Hodnota odsazení Y:	0,00

### Protokol Plocha/Délka/Součet

Souhrn vrstev					
Vrstva	Barva	Styl linie	Objekty	Celková délka (m)	Celková plocha (m²)
DOP_OB15		Plná	3	174,08	—
DOP_OB5		Plná	1	11,03	—
DOP_OB8		Plná	12	247,92	
PL_živ_Chod_hotovo		Plná	3		631,3
PL_živ_Chod_dodělat		Plná	1		22,8
PL_živ_KOM		Plná	1		674,1
<b>Celkem</b>			<b>21</b>		

24.11.2021 16:07:24	D:\Tom\Synology_GKV\KVary\78_21_Jízdírenská_KV_Real\3_Protokoly_o_předaných_Geo_pracích\78_21_04\78_21_04_GDSPS.vce	Trimble Business Center
---------------------	---	-------------------------



## Požadavek zhotovitele na změnu č. 6

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“

Datum vydání požadavku:

Adresa objednatele:  
**Statutární město  
Karlovy Vary  
Moskevská 21  
361 20 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

**SO A: Dopravní část**

### Popis změny, technického řešení:

#### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

PDPS předepisovala doplnění výsadby stromů v do zelených ploch.

#### Nové řešení:

Na p.p.č. 2181, která je v soukromém vlastnictví, se nebude provádět výsadba stromů.

#### Zdůvodnění změny:

Po dohodě s vlastníky p.p.č. 2181 nebude provedena výsadba stromů. Jedná se o neprovedení celkem 3 ks stromů vč souvisejících položek.

#### Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Bude zakresleno v DPSP.

#### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Beze vlivu na termín a kvalitu. Předpokládaná úspora ve výši 25 706 Kč bez DPH.

## Požadavek zhotovitele na změnu č. 6

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská – rekonstrukce“


---

**Vyjádření zhotovitele:**

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):**

a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu

b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla

c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu

d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu

e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:

**Vyjádření objednatele:**

Datum:

Podpis:



# Ocenění ke změně č. 6

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“

číslo projektu:

ocenění číslo ke změně č. / ze dne:

6 /

název části stavby (stavební objekt):

SO A: Dopravní část

Na základě žádosti zhotovitele ze dne

se odsouhlasuje změna:

smlouva						
Poř.č.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
<b>Nové položky</b>						
						0,00
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>
<b>Odstraněné položky</b>						
						0,00
<b>Celkem:</b>						<b>0,00</b>
<b>Změněné položky</b>						
	183101322	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	2 411,61	-7 234,83
	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-6,600	1 205,10	-7 953,66
	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	608,16	-1 824,48
	02660390R	Prunus serotina "Kanzan" K	kus	-3,000	2 164,50	-6 493,50
	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-3,000	40,20	-120,60
	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-3,000	101,33	-303,99
	05217108	tyče dřevěné v kůře D 80mm dl 6m	m3	-0,096	1 743,30	-167,36
	18500010R	Zavazňovací plastová trubka pro zajištění koreňů stromů dl.cca 2,5 m - umístění během osazení stromu, dožluka dopravní	kus	-3,000	535,86	-1 607,58
<b>Celkem:</b>						<b>-25 706,00</b>
<b>Celkem - „Karlovy Vary, ulice Jízdárenská - rekonstrukce“ :</b>						<b>-25 706,00</b>

<b>Celkem včetně DPH 21 %</b>	<b>-31 104,26</b>
Celkem včetně DPH 21 %	

V Karlových Varech dne:

Projektant: BPO spol. s r.o.

Objednatel: Statutární město Karlovy Vary

TDI: BURETAS s.r.o.
