

Požadavek zhotovitele na změnu č.01
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Kollárova – parkovací stání“

Adresa objednatele:

Datum vydání požadavku: 20. 10. 2025

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SoD):

Vybudování Karlovy Vary, ulice Kollárova – parkovací stání- SoD: 2024-00054/ORI SML35-62101/2024

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

ZM 1 - Pokládka živíc u kruhového objezdu. **Nebylo předmětem projektu**

ZM 2 - Chodníky u schodiště. **Nebylo předmětem projektu**

ZM 3 - Skutečnost **Bylo předmětem projektu**

Nové řešení:

ZM 1 - Odfrézování části úseku a pokládka nové ohrusné vrstvy

ZM 2 - Odstranění stávajících konstrukčních vrstev a provedení nových včetně povrchů

ZM 3 - Narovnání jednotlivých položek na skutečně provedené stavební práce.

Zdůvodnění změny:

ZM 1 - Požadavek objednatele na propojení s kruhovým objezdem.

ZM 2 - Požadavek objednatele na výškovou úpravu k nově vybudovaným schodům ke škole.

ZM 3 – Řeší narovnání jednotlivých položek na skutečně provedené stavební práce

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

ANO

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Termín – bez vlivu

Cena – **SNÍŽENÍ** ceny díla o 2.744,13- Kč bez DPH.

~~NAVÝŠENÍ~~ ceny díla o ~~—~~ Kč bez DPH

Z toho vyplývá **SNÍŽENÍ** ceny díla o

Požadavek zhotovitele na změnu č.01
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Kollárova – parkovací stání“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 20. 10. 2025 se odsouhlasuje změna:

viz ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Rozpočet změny

ZM 1 - plocha živin na začátku úseku

Sazba: Karlovy Vary, ulice Kollárova – parkovací stání
 Objekt:

předmět výpočtu		Název položky		m.j.	hm.j.	SI	SI	SI	SI
12	11372	PRŮŘEZÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M	890,00	K2				
21	17223	OPLOTVACÍ KOSTKY Z EMULZE DO 1:100/M2	M2	12,00	K2				
41	174433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNĚ VRSYVY ACO 8 TL 40MM	M2	275,00	K2				
CELKEM		bez DPH							
									89 413,00 K2

Datum:

Za zhotovitele:

Rozpočet změny

ZM 2 - chodníky u schodů

Sazba: Karlovy Vary, ulice Kollárova – parkovací stání
 Objekt:

předmět výpočtu		Název položky		m.j.	hm.j.	SI	SI	SI	SI
9	11332	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ	M	30,00	K2				
21	1610	LEPBA PLANŠE ŽELEZNÝM VÝJEDNĚNÍM I	M2	11,00	K2				
26	16336	VOZOVKOVÉ VRSYVY Z BETONU	M2	11,00	K2				
50	16721	ZÁKLADOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 8/8 30MM	M	400,00	K2				
6	16137777	Podkladní vrstva pod dlažbu vozovky nebo do sklonu 1:1 z kamenné třískové d	M2	11,00	K2				
8	16131111	Kladná odvodňovací drenáž s výškou 10 cm nad povrchem a výškou 50 cm	M2	275,00	K2				
8	16131111	Kladná odvodňovací drenáž s výškou 10 cm nad povrchem a výškou 50 cm	M2	275,00	K2				
CELKEM		bez DPH							
									80 845,00 K2

Datum:

Za zhotovitele:

Rozpočet změny

ZM 3 - rozdíl skutečně provedených prací proti projektu

Sazba: Karlovy Vary, ulice Kollárova – parkovací stání
 Objekt:

předmět výpočtu		Název položky		m.j.	hm.j.	SI	SI	SI	SI
13	113761	PRŮŘEZÁNÍ DLAŽBY PRŮŘEZU DO 100MM V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	300,00	K2				
26	1647225	ZPRACOVÁNÍ VRSYVY STRONU KAMENNÉ DO 100MM	M2	1 000,00	K2				
33	16638	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z TVARNIC Z PLASTICKÝCH SMOT	M2	300,00	K2				
37	17223	OPLOTVACÍ KOSTKY Z EMULZE DO 1:100/M2	M2	11,00	K2				
40	174431	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNĚ VRSYVY ACO 8 TL 40MM	M2	400,00	K2				
41	174433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNĚ VRSYVY ACO 8 TL 40MM	M2	275,00	K2				
43	16336	VOZOVKOVÉ VRSYVY Z BETONU	M2	11,00	K2				
44	16336	VOZOVKOVÉ VRSYVY Z BETONU	M2	11,00	K2				
46	16336	VOZOVKOVÉ VRSYVY Z BETONU	M2	11,00	K2				
48	16336	VOZOVKOVÉ VRSYVY Z BETONU	M2	11,00	K2				
50	16721	ZÁKLADOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 8/8 30MM	M	400,00	K2				
52	16721	ZÁKLADOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 8/8 30MM	M	400,00	K2				
54	16721	ZÁKLADOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 8/8 30MM	M	400,00	K2				
56	16721	ZÁKLADOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 8/8 30MM	M	400,00	K2				
58	16721	ZÁKLADOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 8/8 30MM	M	400,00	K2				
60	16721	ZÁKLADOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 8/8 30MM	M	400,00	K2				
62	16721	ZÁKLADOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 8/8 30MM	M	400,00	K2				
CELKEM		bez DPH							
									101 700,00 K2


Datum:

Za zhotovitele:


$\frac{4}{7}$

Požadavek zhotovitele na změnu č.01
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Kollárova – parkovací stání“

ZM č.1 – grafická část

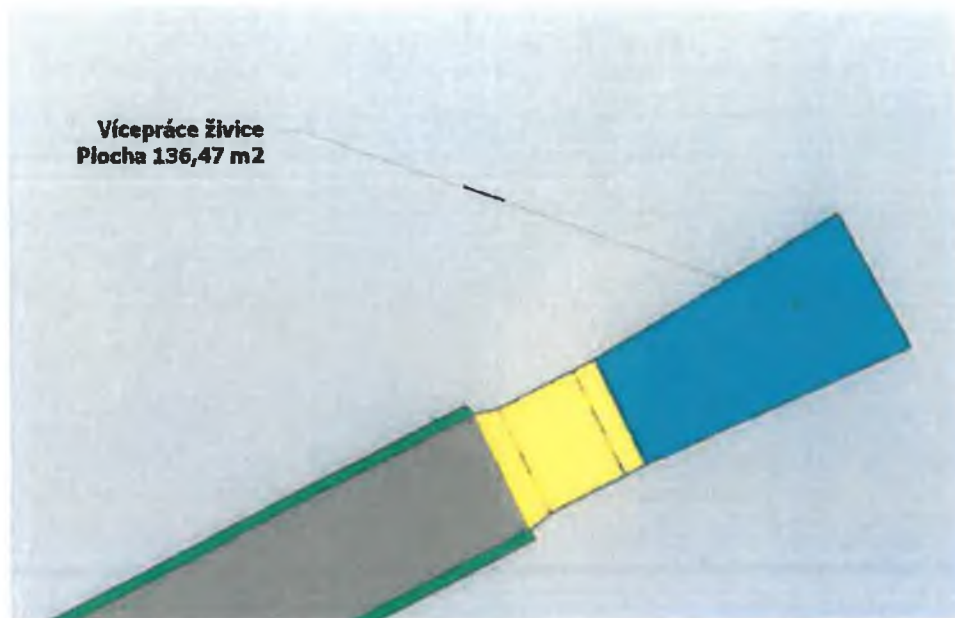


ZM č.2 – grafická část

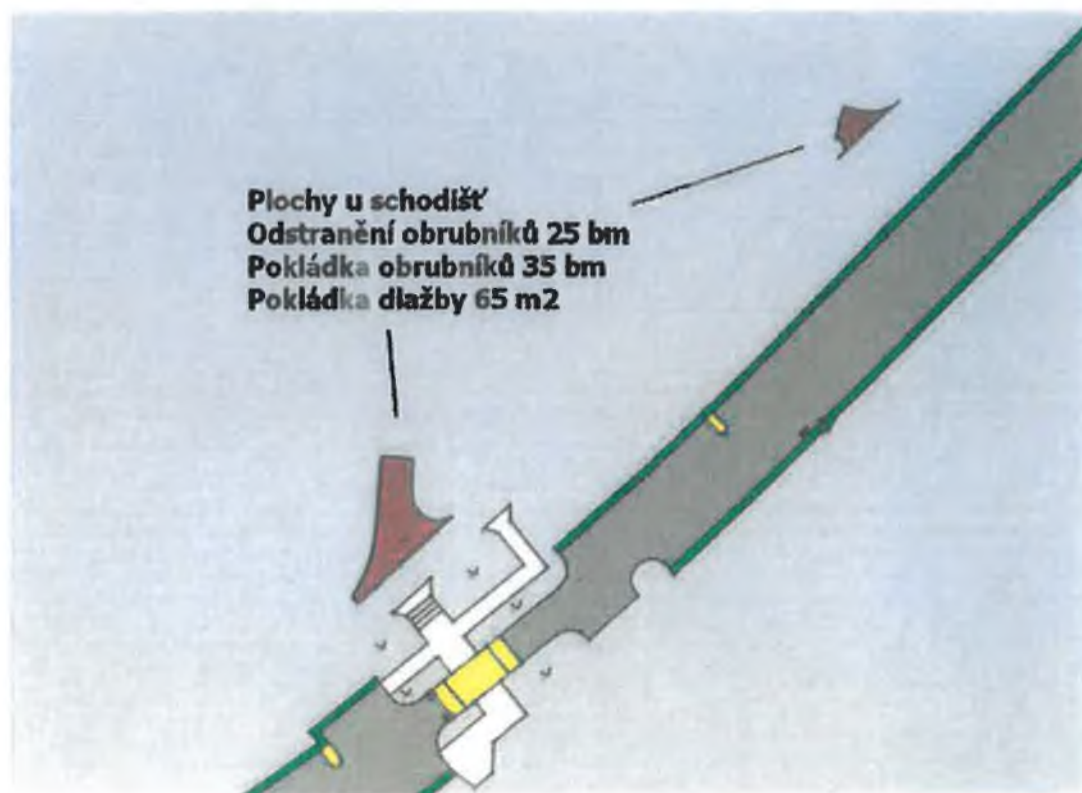

Požadavek zhotovitele na změnu č.01
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Kollárova – parkovací stání“

ZM č.3 – grafická část

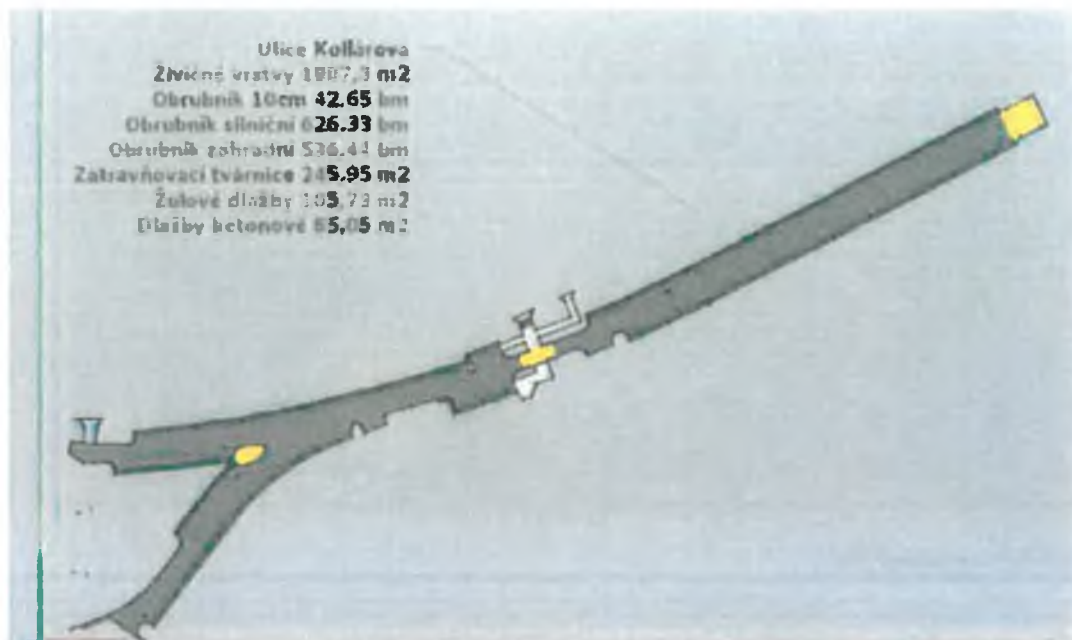

V Karlových Varech dne: 20.10.2025

Zhotovitel: Petr Hudlický

Projektant: Ing. Jan Soukup

Objednatel: Ing. František Kocourek

TDI: Ing. Jan Froněk

Požadavek zhotovitele na změnu č.01
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Kollárova – parkovací stání“

Vyjiádření projektanta: **Bez připomínek**

Datum:

Podpis:

Vyjiádření objednatele: S provedenou změnou souhlasíme

Datum:

Podp

Karlovy Vary, ulice Kollárova - parkovací stání

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ (ZL) příkládaných k dodatku č.1 SOD a ROZBOR CENY za provedení díla

Číslo změny	Popis změny	Ceny v Kč bez DPH				Poznámka
		Vícepráce	Neprovedené práce z nabídkového rozpočtu	Součet víceprací a neprovedených prací	Hodnota změny	
1	Plocha živice - nová obrusná vrstva v Kollárově ul. u okružní křižovatky ulic Stará Kysibelská, Kollárova, Blahoslavova	58 613,87	0,00	58 613,87	58 613,87	
2	Obnova povrchu chodníku podél ulice Kollárova před 2 schodišti vedoucími k Základní škole J.A.Komenského (před každým schodištěm)	80 545,00	0,00	80 545,00	80 545,00	
3	Rozdíl mezi skutečně provedenými pracemi a pracemi podle výkazu výměr nabídkového rozpočtu	0,00	-141 903,00	-141 903,00	141 903,00	

SOUČTY 139 158,87 -141 903,00 -2 744,13 281 061,87

ROZBOR CENY za provedení díla (v Kč bez DPH)

Cena podle SOD	4 559 656,24
Neprovedené práce z nabídkového rozpočtu (méněpráce)	-141 903,00
Vícepráce dle změnových listů	139 158,87
SOUČET, tj. cena za provedení díla bez DPH podle dodatku č.1 SOD	4 556 912,11
SOUČET, tj. cena za provedení díla včetně DPH podle dodatku č.1 SOD	5 513 863,65
	956 951,54

Kč bez DPH

Kč včetně DPH

DPH

Snížení ceny díla v Kč bez DPH

-2 744,13

Kč bez DPH

Snížení ceny díla v Kč včetně DPH 21%

-3 320,40

Kč včetně DPH

12.11.2025, zpracoval: František Kocourek



KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
M 1:500

ULICE NARODNÍ

ULICE KOTLOVÁ

ULICE STARÉ KRYŠEBSKÉ

BUDOVANÁ ULICE

Změna č. 1

Základní škola J. A. Komenského

Kollárova ulice

Karlový Vary, ulice Kollárova – parkovací stání
PŘEHLÉD ZMĚN 12.11.20

12.11.2025

<p>KARLOV VARY - ULICE MOLLAROVA</p> <p>PARKOVACÍ STÁNÍ</p>	<p>Wearing SURF.</p> <p>ASPHALT</p>	<p>TYPE</p> <p>SPRUE</p>
<p>ADDITIONAL INFORMATION</p> <p>NO. 1 - VARIOUS</p> <p>NO. 2 - BARRACK</p>	<p>20000 INFLUENT</p> <p>NO. 1 - BARRACK</p> <p>NO. 2 - BARRACK</p>	<p>NO. OF TUBES</p> <p>NO. 1 - 1</p> <p>NO. 2 - 1</p>
<p>ADDRESS</p> <p>KARLOV VARY - ULICE MOLLAROVA</p> <p>PARKOVACÍ STÁNÍ</p>	<p>ADDRESS</p> <p>KARLOV VARY - ULICE MOLLAROVA</p> <p>PARKOVACÍ STÁNÍ</p>	<p>ADDRESS</p> <p>KARLOV VARY - ULICE MOLLAROVA</p> <p>PARKOVACÍ STÁNÍ</p>
<p>COMMENTS</p> <p>KARLOV VARY - ULICE MOLLAROVA</p> <p>PARKOVACÍ STÁNÍ</p>	<p>COMMENTS</p> <p>KARLOV VARY - ULICE MOLLAROVA</p> <p>PARKOVACÍ STÁNÍ</p>	<p>COMMENTS</p> <p>KARLOV VARY - ULICE MOLLAROVA</p> <p>PARKOVACÍ STÁNÍ</p>

Upozornění:
Zařízení podrobeno zkoušce proudem po celé orientaci a nebylo uloženo vytvářet vinosky před zavedením stavebního proud. Je nutné u správné zabudování ježich vytváření.

LEGENDA VÝZNAMNÝCH LOKALIT

PAINTING EFFICIENCY

LEGENDA VEGETAČNICH ÚPRAV

0052 STROM

51KOH

LEGENDA NOVÝCH SÍTI

DRENUZIN PO

PRÉPOLYMERES / OPENÉES / SACS

LEGENDA VEGETAČNICH ÚPRAV

0052 STROM

51KOH
