

Požadavek zhotovitele na změnu č.10

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 11.11.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle PD měly být podkladní vrstvy cementové stabilizace.

Nové řešení:

Po odkrytí stávajících vrstev bylo zjištěno, že podkladní vrstvy nejsou stabilizace, ale betonové vrstvy s výztuží. Z tohoto důvodu byla navržena tato změna.

Zdůvodnění změny:***Změna původních materiálů*****Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:****Ano****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:****Termín - žádný, Cena díla - dojde k navýšení ceny**

Požadavek zhotovitele na změnu č.10

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 11.11.2024

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nejsou žádné další podmínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



Ocenění ke změně č. 10
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

číslo projektu: 2024-00014/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 10

Název části stavby (stavební objekt): „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 11.11.2024 se odsouhlasuje změna:

Stavba:		Soupis provedených stavebních prací							
		„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“							
Objekt:		0		Rozpočet		Změna č.10 - bourání			
						betonu park. OSA 3			
								37 117,42 Kč	
	4	113107231R	Odstavení podkladu z cementové stabilizace d přes 180 do 150 mm strojně pí přes 200	m2	880,00	135,00	-150,59	-20 329,65 Kč	
	120	997221574	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	84,00	80,00	9,04	799,13 Kč	
	121	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	420,00	30,00	9,94	298,17 Kč	
	122	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládacím) z proměny	t	691,43	170,00	9,94	1 689,62 Kč	
ZM9		113107172	Odstavení podkladu z betonem prostého d přes 150 do 300 mm strojně pí 50-200 mm	m2		363,00	150,59	54 664,17 Kč	
		CELKEM	bez DPH		2 075,43			37 117,42 Kč	
		CELKEM	vč. DPH					44 912,08 Kč	

Datum: Za zhotovitele:
Street line s.r.o.

V Karlových

Projektant

Objednatel

TDI:

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“ Název objektu:		číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: Změna č. 10 - bourání betonu park. OSA 3										
Obsah: Krycí list: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 80%;">Záznam o změně - počet stran A4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; width: 10%;">5</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="width: 80%;">Grafické přílohy - počet stran A4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; width: 10%;">1</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="width: 80%;">Další přílohy - počet stran A4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; width: 10%;">3</div> </div>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; width: 10%;">číslo</th> <th style="text-align: left;">příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">paré</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		číslo	příjemce	paré		1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor
číslo	příjemce												
paré													
1	Dodavatel												
2	Projektant												
3	Stavební dozor												
Iniciátor změny: Investor													
Popis a zdůvodnění změny: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <p>Při realizaci stavebních prací bylo zjištěno, že na části nově budovaného parkoviště na ose 3 nejsou podklady dle předpokladu PD. PD předpokládala stabilizace, ale ve skutečnosti byly zjištěny betonové plochy tl. 15 cm s výztuží</p> </div>													
Přílohy: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Zápis o projednání soupisu prací a ceny objektu Položkový rozpočet dodatku a soupis prací vč. změn Doklady a vyjádření </div>													
Stavba celkem v Kč (bez DPH):													
Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %									
6 817 625,36	6 373 061,16	37 117,42	6 410 178,58	-6%									
Zhotovitel	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>	datum	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>									
Projektant (autorský dozor)	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>	datum	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>									
TDI stavby	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>	datum	Václav Vlček	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>									
Objednatel	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>	datum	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>									
Změny během výstavby - krycí	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 30px;"></div>									

Street line s.r.o.

Chudovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
 Telefon: 724 558 144 – Petr Hudlický ZM.10 – Stabilizace Konečná ulice – K.Vary

Soupis provedených stavebních prací
„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Stavba:

Objekt:

Název položky				Rozpočet		Změna č.10 - bourání betonu park. OSA 3
objekt	ref. čid	objekt	ref. čid	1000	1000	
	4	113107231R		880,00	135,00	37 117,42 Kč
	120	997221571	t	84,00	80,00	-150,59
	121	997221579	t	420,00	30,00	9,94
	122	997221861	t	691,43	170,00	9,94
ZM19		113107172	m2		363,00	150,59
		CELKEM	bez DPH	2 075,43		37 117,42 Kč
		CELKEM	vč. DPH			44 912,08 Kč

Datum:


Václav Vlček

Za zhotovitele:
Street line s.r.o.

Street line s.r.o.

Chvaldovská 397/8360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
 Telefon: [redacted] – Petr Ihulický ZM19 – Stabilizace Konečná ulice – K.Vary

PROJEKT REKONSTRUKCE ULICE KONEČNÁ KARLOVY VARY

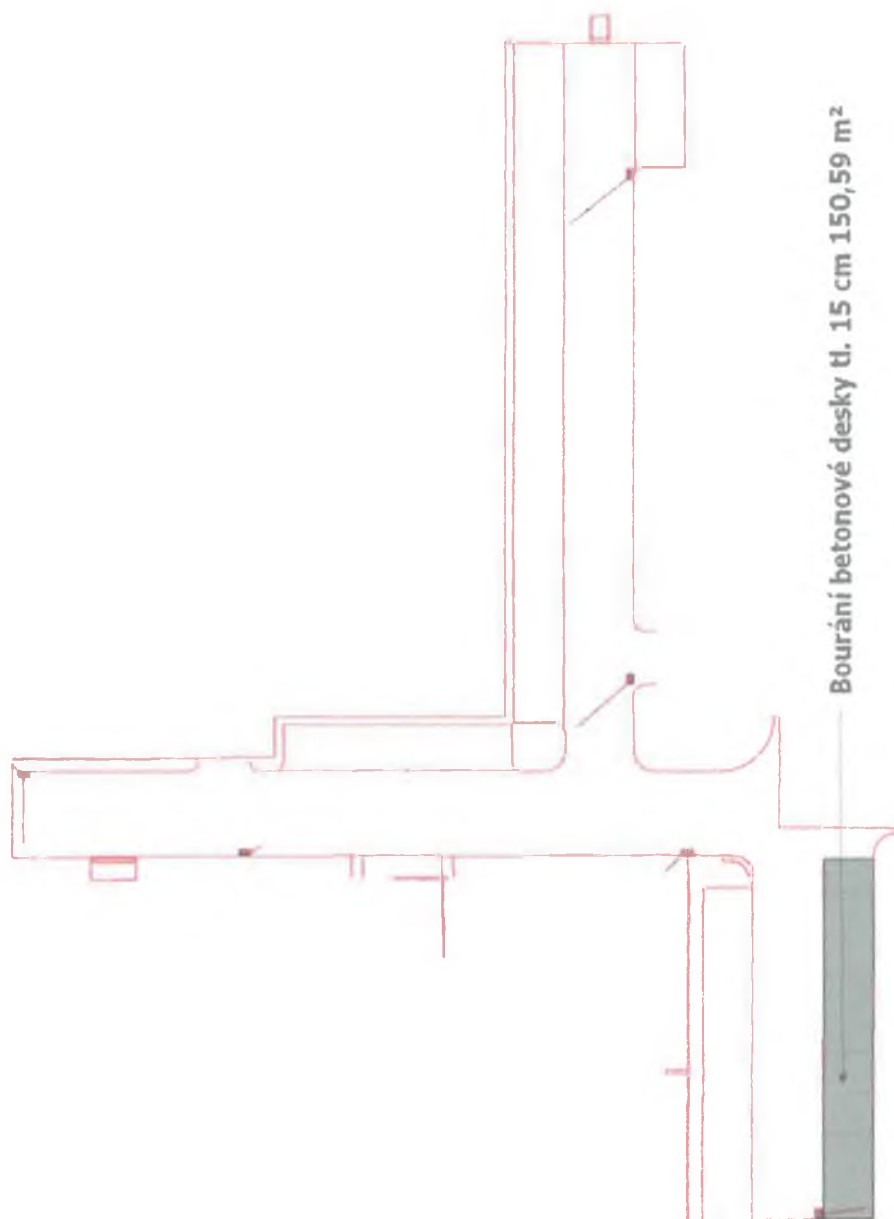

Street line s.r.o.

Cháskovská 395/8, 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u ORKSTřebíč, s.r.l. c. vložka 25014
Telefon: [REDACTED] - Petr Hladický ZMĚ.10 - Stabilizace Konečná ulice - K.Vary

List č. 6005287

Oprava zatravněvacího střešního

Pondělí

Počasí: zataženo, bouřky, teploty od 17°C - 23°C
 Pracovní doba: Od 7.⁰⁰ - 16.⁰⁰ hodin
 Pracovníci: Petráček Ivan, Pavlík Štěpán, Jiří Yarencuk, Michal Šorban
 Dubas Michal
 Mechanizace: Hitaschi ZX 55, válec, scania 8x4
 Subdodávky: Michal Brano

Popis stavebních prací:

- Pokládka zatravněvací dlažby OSA 2
- Bourání betonů parkoviště OSA 3, odvoz materiálu
- Pokládka obrubníků (realizace vjezdu - změna PD)

Za zhotovitele:

Poznámka: Bourání stabilizace pro parkoviště OSA 3 je prováděno bu
 kladivem. Ve skutečnosti jsou to železobetonové desky. (změna proti PD) ~~žádám o~~
 vyjádření



Záměr PD 1

V komunikaci v ul. 3 se provádí bourání
 betonových ploch stabilizace
 která budou (převážně) převáženy
 ze střešního dvoráku

/Hudc

Street line s.r.o.

Chudovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
 Telefon: [redacted] Petr Hudlický ZM.É.10 - Stabilizace Konečná ulice - K.Vary



Street line s.r.o.

Chudovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: [REDACTED] Petr Hudlický ZM.č.10 – Stabilizace Konečná ulice – K.Vary

Požadavek zhotovitele na změnu č.11

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 11.11.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Popis změny, technického řešení:**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:***Dle PD měly být určitý počet značek, a realizace chrániček pro kabely***Nové řešení:***Po novém upřesnění dopravních značek a neprovádění přeložek v rámci stavby, byly tyto práce odečteny.***Zdůvodnění změny:***Skutečný rozsah prací.***Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:****Ano****Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:****Termín - žádný, Cena díla - dojde k ponížení ceny**

Požadavek zhotovitele na změnu č.11

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 11.11.2024

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 11
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

číslo projektu: 2024-00014/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 11

Název části stavby (stavební objekt): „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 11.11.2024

se odsouhlasuje změna:

Stavba: Soupis provedených stavebních prací
„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Objekt:

0

Rozpočet

Změna č.11 - skutečnost,
pokopy, značky

-59 592,50 Kč									
objekt	podřiz	části pokopů							
	68	899131111	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním rámu z litiny a betonu	kus	12,00	3 650,00	-4,00	-14 600,00 Kč	
	69	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vstupu do 200 mm výškovým pokopu	kus	1,00	2 000,00	7,00	14 000,00 Kč	
Mat	71	28661932	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,00	4 000,00	1,00	4 000,00 Kč	
	81	914111111	Montáž svale dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	15,00	1 000,00	-5,00	-5 000,00 Kč	
	83	40445608	značky upravující přednost P1, P4 700mm	kus	1,00	3 200,00	-1,00	-3 200,00 Kč	
	84	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,00	3 200,00	-2,00	-6 400,00 Kč	
	86	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12a, E17 500x500mm	kus	2,00	850,00	-2,00	-1 700,00 Kč	
	89	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	14,00	750,00	-8,00	-6 000,00 Kč	
Znač	90	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	14,00	450,00	-8,00	-3 600,00 Kč	
	91	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	14,00	100,00	-8,00	-800,00 Kč	
	92	914531111	Montáž návěstce na sloupek velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek	kus	15,00	550,00	-5,00	-2 750,00 Kč	
	93	40445257	svorka upevňovací na sloupek D 70mm	kus	15,00	100,00	-5,00	-500,00 Kč	
	126	460791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh rubových D přes 90 do	m	410,00	45,00	-410,00	-18 450,00 Kč	
	127	34571366	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvojitá dvojitá korugovaná D 100/120mm	m	430,50	85,00	-430,50	-36 592,50 Kč	
ZM11		899132122	Výměna (výšková úprava) pokopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu	ks		10 000,00	3,00	30 000,00 Kč	

		CELKEM	bez DPH		946,50			-59 592,50 Kč	
		CELKEM	vč. DPH					-72 106,93 Kč	

Datum:

Za zhotovitele:
Street line s.r.o.

V Karlových V

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“		číslo objektu / číslo změny objektu:	číslo změny: Změna č.11 – skutečnost, pokopy, značky
Název objektu:			

Obsah: Krycí list:	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">číslo paré</th> <th style="text-align: left;">příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor
číslo paré	příjemce								
1	Dodavatel								
2	Projektant								
3	Stavební dozor								

Záznam o změně - počet stran A4 3	
Grafické přílohy - počet stran A4 1	
Další přílohy - počet stran A4 1	

Initiátor změny: Investor

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší změnu v dopravních značkách a dále nerealizované chráničky

Přílohy:

Zápis o projednání soupisu prací a ceny objektu
 Položkový rozpočet dodatku a soupis prací vč. změn
 Doklady a vyjádření

Stavba celkem v Kč (bez DPH):				
Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %
6 817 625,36	6 410 178,58	-59 592,50	6 350 586,08	-7%

Zhotovitel		datum
Projektant (autorský dozor)		datum
TDI stavby		datum Václav Vlček
Objednatel		datum
Změny během výstavby - krycí li		

Street line s.r.o.

 Chodovská 397/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u ORKs Plzeň, odd. C, vložka 25014
 Telefon: Petr Hrdlický ZM.č.11 – skutečnost pokopy a značky Konečná ulice – K. Vary

Soupis provedených stavebních prací „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Stavba:

Objekt:

				Rozpočet		Změna č.11 - skutečnost, pokopy, značky
						-59 592,50 Kč
68	899131113	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním rámu z litiny a betonu	kus	12,00	3 650,00	-4,00 -14 600,00 Kč
69	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,00	2 000,00	7,00 14 000,00 Kč
71	28661932	Poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	1,00	4 000,00	-1,00 -4 000,00 Kč
81	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² obřímkami na sloupek nebo konzolu	kus	15,00	1 000,00	-3,00 -5 000,00 Kč
83	40445608	značky upravitelci přednost P1, P4 700mm	kus	1,00	3 200,00	-1,00 -3 200,00 Kč
84	40445612	značky upravitelci přednost P2, P3, P8 750mm	kus	2,00	3 200,00	-2,00 -6 400,00 Kč
86	40445647	dodatekové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	2,00	850,00	-2,00 -1 700,00 Kč
89	914511111	Montáž sloupku dopravních značek dělký do 3,5 m s betonovým základem	kus	14,00	750,00	-8,00 -6 000,00 Kč
90	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	14,00	450,00	-8,00 -3 600,00 Kč
91	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	14,00	100,00	8,00 -800,00 Kč
92	914531111	Montáž nástavce na sloupky velikosti do 1 m ² pro uchycení dopravních značek	kus	15,00	550,00	-5,00 -2 750,00 Kč
93	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	15,00	100,00	-3,00 -500,00 Kč
126	400791114	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýh tuhých D přes 90 do	m	410,00	45,00	-410,00 -18 450,00 Kč
127	34571366	trubka elektroinstalací HDPE tuhá dvoupásťová korugovaná D 100/120mm	m	430,50	85,00	-430,50 -36 502,50 Kč
ZM11	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu	ks		10 000,00	3,00 30 000,00 Kč
				CELKEM	946,50	-59 592,50 Kč
				CELKEM	vč. DPH	-72 106,93 Kč

Datum:

Za zhotovitele:

Street line s.r.o.

Členská 325/8 360 06 Karlovy Vary, KČ: 291 01 823, DIČ: CZ291 01 823, Registrováno u OK KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: Petr Hudlický ZMČ.11 – skutečnost pokopy a značky Konečná ulice – K.Vary



Street line s.r.o.


Chodovská 395/8, 360 06 Karkov Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon: [REDACTED] Petr Hudlický ZMČ.11 – skutečnost poklopy a značky Konečná ulice – K.Vary

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Kadan', Vary, K.Č. 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrované u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telef. [redacted] Petr Hudlický, ZMČ.11 – skutečnost poklopy a značky Konenčná ulice – K. Vary

PROJEKT REKONSTRUKCE ULICE KONEČNÁ KARLOVY VARY

1 ks kopieš čtvercový 8 ks šachty vč. poklopů
7 ks zásek:perní s deskou 14 ks výšková úprava
8 ks komplet vpusť 8 ks komplet vpusť

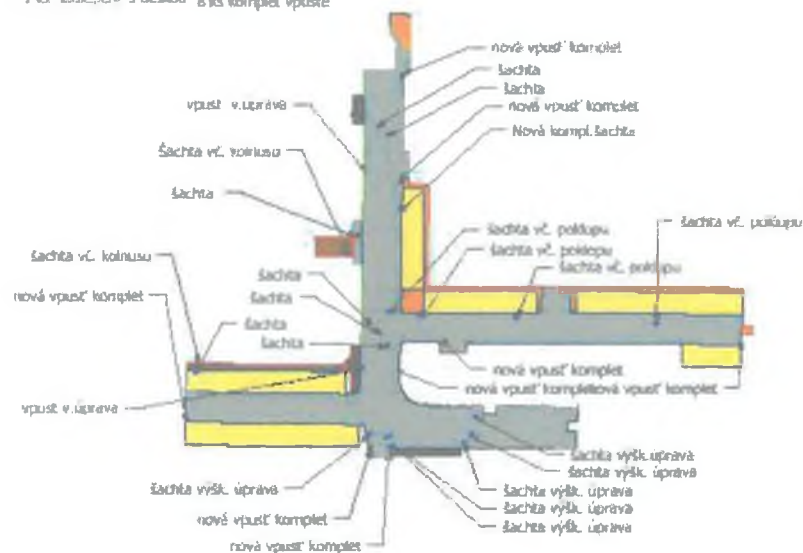

Street line s.r.o.

Chedovska 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
Telefon [redacted] – Petr Hrdlický ZMě.11 – skutečnost poklopy a značky Konečná ulice – K. Vary

Požadavek zhotovitele na změnu č.12

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 11.11.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle PD měly být původní konstrukční vrstvy odstraněny.

Nové řešení:
Původní konstrukční vrstvy nebyly odstraněny a byly provedeny vyrovnávky z živličných vrstev.

Zdůvodnění změny:
Pro výškové vyrovnání a odtok povrchových vod bylo nutné provést vyrovnávky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Termín - žádný, Cena díla - dojde k navýšení ceny

Požadavek zhotovitele na změnu č.12

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 11.11.2024

Podpis:

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor).

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:






Podpis:

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 12


se odsouhlasuje změna:

TDI:

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“ Název objektu:		číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: Změna č.12 - vyrovnávky								
Obsah: Klíčový list: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>Záznam o změně - počet stran A4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">8</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div>Grafické přílohy - počet stran A4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div>Další přílohy - počet stran A4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> </div>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">číslo paré</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2</td> <td style="padding: 5px;">Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> <td style="padding: 5px;">Stavební dozor</td> </tr> </table>		číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor
číslo paré	příjemce										
1	Dodavatel										
2	Projektant										
3	Stavební dozor										
Iniciátor změny: Investor											
Popis a zdůvodnění změny:											
Změnový list řeší realizaci vyrovnávek na plochách, které byly ponechány. (cementové stabilizace)											
Přílohy: Zápis o projednání soupisu prací a ceny objektu Položkový rozpočet dodatku a soupis prací vč. změn Doklady a vyjádření											
Stavba celkem v Kč (bez DPH):											
Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %							
6 817 625,36	6 350 586,08	432 847,65	6 783 433,73	-1%							
Zhotovitel		datum									
Projektant (autorský dozor)		datum									
TDI stavby		datum									
Objednatel		datum									
Změny během výstavby - krycí list											

Street line s.r.o.

 Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
 Telefon:  Petr Huříček ZM.12 – vyrovnávky Konečná ulice – K.Vary

Soupis provedených stavebních prací „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Stavba:

Objekt:

Objekt:		Rozpočet		Změna č.12 - vyrovnávky	
125	99825111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonem	140,00	136,93	18 330,20 Kč
ZM12	5774EG	Vrstvy pro obnovu a opravy z asf betonu ACP 16+	7 915,17	52,17	414 517,45 Kč
	CELKEM	bez DPH			432 847,65 Kč
	CELKEM	vč. DPH			523 745,66 Kč

Datum:

Václav Vlček
Digitálně podepsal Václav Vlček
Datum: 2024.11.14 17:35:25
+01'00'

Digitálně podepsal Václav Vlček
Datum: 2024.11.14 17:35:25

Digital:
Datum:
+01'00'

Street line s.r.o.

Technická zpráva

Název akce : K.Vary - Čankovská
Parkování v ul. Konečná

Číslo zakázky: 24008

Datum zaměření : 7.9.2024

Datum vyhotovení: 23.10.2024

Předmět : zaměření a výpočet

Zaměřil : J.Kočí

Vyhotovil: J.Kočí

Podklady: projektová dokumentace

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Třída přesnosti měření : 3

Použité přístroje : Leica TCRA 1203+

GNSS South galaxi G1

Postup prací:

Na základě objednávky a instrukcí p.Hudlického za Streetline s.r.o. bylo provedeno zaměření dne 7.9.2024 před pokládkou nového asfaltu. Dále bylo použito závěrečné zaměření, které provedl Ing.Pánek dne 26.9.2024. Tyto dvě zaměření byly použity pro výpočet kubatury vyrovnávek. Pokládka živice měla být dle projektové dokumentace v mocnosti 10cm. Tato hodnota byla odečtena od celkových kubatur a byla vypočtena kubatura vyrovnávek.

Protokol z výpočtu kubatur :

= Kubatury

Bod 1	Výška	Bod 2	Výška	Bod 3	Výška	kubatura	plocha
0000 0000 0202	378.17	0000 0000 0198	378.21	0000 0000 0200	378.04	7.90	56.46
0000 0000 0209	378.31	0000 0000 0198	378.21	0000 0000 0202	378.17	13.33	57.94
0000 0000 0224	378.41	0000 0000 0198	378.21	0000 0000 0209	378.31	12.46	40.19
0000 0000 0224	378.41	0000 0000 0192	378.38	0000 0000 0198	378.21	16.94	50.82

Označení kubatury: K1

Kubatura: 50.63 m3 plocha: 205.41 m2 srovnávací rovina: 378.00 m

= Kubatury

Bod 1	Výška	Bod 2	Výška	Bod 3	Výška	kubatura	plocha
0024 0709 0003	378.18	0024 0709 0001	377.91	0024 0709 0002	378.04	1.48	57.20
0024 0709 0003	378.18	0024 0709 0004	378.09	0024 0709 0001	377.91	3.31	55.25
0024 0709 0005	378.28	0024 0709 0004	378.09	0024 0709 0003	378.18	7.35	40.10
0024 0709 0005	378.28	0024 0709 0006	378.26	0024 0709 0004	378.09	10.66	50.76

Označení kubatury: K2

Kubatura: 23.81 m3 plocha: 203.31 m2 srovnávací rovina: 378.00 m

K = K1 - K2 = 26.82 m3

Projektovaná kubatura : 20.5 m3 vyrovnávka : 6.32 m3

1

== Kubatury

Bod 1	Výška	Bod 2	Výška	Bod 3	Výška	kubatura	plocha
0000 0000 0120	378.46	0000 0000 0121	378.39	0000 0000 0234	378.34	6.37	16.06
0000 0000 0120	378.46	0000 0000 0234	378.34	0000 0000 0233	378.35	6.38	16.63
0000 0000 0051	378.57	0000 0000 0120	378.46	0000 0000 0233	378.35	14.52	31.56
0000 0000 0233	378.50	0000 0000 0051	378.57	0000 0000 0233	378.35	30.57	64.59
0000 0000 0235	378.50	0000 0000 0050	378.56	0000 0000 0051	378.57	6.88	12.67
0000 0000 0045	378.64	0000 0000 0050	378.56	0000 0000 0235	378.50	27.84	49.13
0000 0000 0045	378.64	0000 0000 0235	378.50	0000 0000 0246	378.55	20.38	36.18
0000 0000 0036	378.66	0000 0000 0045	378.64	0000 0000 0246	378.55	22.19	35.99
0000 0000 0036	378.66	0000 0000 0246	378.55	0000 0000 0247	378.61	24.09	39.71
0000 0000 0247	378.61	0000 0000 0034	378.64	0000 0000 0036	378.66	2.19	3.44
0000 0000 0027	378.68	0000 0000 0034	378.64	0000 0000 0247	378.61	16.27	25.28
0000 0000 0249	378.56	0000 0000 0027	378.68	0000 0000 0247	378.61	22.98	37.26
0000 0000 0024	378.70	0000 0000 0027	378.68	0000 0000 0249	378.56	20.81	32.18
0000 0000 0256	378.65	0000 0000 0024	378.70	0000 0000 0249	378.56	14.47	22.73
0000 0000 0014	378.59	0000 0000 0024	378.70	0000 0000 0256	378.65	16.61	25.68
0000 0000 0014	378.59	0000 0000 0256	378.65	0000 0000 0019	378.62	2.22	3.58
0000 0000 0020	378.68	0000 0000 0256	378.65	0000 0000 0021	378.70	0.10	0.15
0000 0000 0021	378.70	0000 0000 0256	378.65	0000 0000 0022	378.69	1.82	2.67

Označení kubatury: K3

Kubatura: 256.69 m3 plocha: 455.51 m2 srovnávací rovina: 378.00 m

== Kubatury

Bod 1	Výška	Bod 2	Výška	Bod 3	Výška	kubatura	plocha
0024 0709 0008	378.24	0024 0709 0026	378.20	0024 0709 0007	378.20	3.56	16.49
0024 0709 0025	378.10	0024 0709 0026	378.20	0024 0709 0008	378.24	2.95	16.39
0024 0709 0009	378.35	0024 0709 0025	378.10	0024 0709 0008	378.24	14.83	64.46
0024 0709 0009	378.35	0024 0709 0024	378.28	0024 0709 0025	378.10	7.56	31.07
0024 0709 0009	378.35	0024 0709 0023	378.25	0024 0709 0024	378.28	3.90	13.30
0024 0709 0022	378.40	0024 0709 0023	378.25	0024 0709 0009	378.35	16.17	48.51
0024 0709 0022	378.40	0024 0709 0009	378.35	0024 0709 0010	378.40	13.87	36.17
0024 0709 0021	378.45	0024 0709 0022	378.40	0024 0709 0010	378.40	15.05	36.11
0024 0709 0021	378.45	0024 0709 0010	378.40	0024 0709 0011	378.48	17.68	39.88
0024 0709 0011	378.48	0024 0709 0020	378.40	0024 0709 0021	378.45	1.60	3.61
0024 0709 0019	378.42	0024 0709 0020	378.40	0024 0709 0011	378.48	10.81	24.95
0024 0709 0012	378.40	0024 0709 0019	378.42	0024 0709 0011	378.48	16.08	37.10
0024 0709 0018	378.45	0024 0709 0019	378.42	0024 0709 0012	378.40	13.75	32.49
0024 0709 0013	378.40	0024 0709 0018	378.45	0024 0709 0012	378.40	9.45	22.68
0024 0709 0017	378.38	0024 0709 0018	378.45	0024 0709 0013	378.40	10.56	23.76
0024 0709 0017	378.38	0024 0709 0013	378.40	0024 0709 0016	378.45	1.34	3.28
0024 0709 0016	378.43	0024 0709 0013	378.40	0024 0709 0015	378.57	4.69	9.91
0024 0709 0015	378.57	0024 0709 0013	378.40	0024 0709 0014	378.47	1.29	2.68

Označení kubatury: K4

Kubatura: 165.14 m3 plocha: 465.05 m2 srovnávací rovina: 378.00 m

K = K3 - K4 = 91,55 m3

Projektovaná kubatura : 455 m3 vyrovnávka : 46,05 m3

Celková kubatura vyrovnávky : 52,37 m3

Seznam souřadnic :

Zaměření 07.09.2024

Č.h.	Y	X	Z
002407090001	851254.396	1009831.213	377.910
002407090002	851253.514	1009825.325	378.040
002407090003	851234.503	1009828.060	378.180
002407090004	851235.997	1009833.851	378.090
002407090005	851221.136	1009829.961	378.280
002407090006	851219.298	1009836.312	378.260
002407090007	851217.868	1009824.669	378.390
002407090008	851217.280	1009820.558	378.240
002407090009	851215.040	1009804.644	378.350
002407090010	851213.759	1009796.646	378.400
002407090011	851212.362	1009785.760	378.480
002407090012	851211.169	1009776.591	378.400
002407090013	851210.400	1009771.023	378.400
002407090014	851209.848	1009767.122	378.470
002407090015	851208.522	1009767.454	378.570
002407090016	851207.350	1009768.172	378.450
002407090017	851206.941	1009768.531	378.380
002407090018	851202.791	1009774.866	378.450
002407090019	851203.886	1009782.852	378.420
002407090020	851204.786	1009789.047	378.400
002407090021	851204.895	1009789.957	378.450
002407090022	851206.178	1009798.929	378.400
002407090023	851207.839	1009810.948	378.250
002407090024	851208.280	1009814.261	378.280
002407090025	851209.375	1009821.904	378.100
002407090026	851209.934	1009825.948	378.300

zaměření 26.09.2024


č.h.	Y	X	Z
002426090001	851208.570	1009767.500	378.680
002426090002	851208.500	1009767.900	378.700
002426090003	851209.850	1009767.130	378.690
002426090004	851202.800	1009774.890	378.700
002426090005	851203.870	1009782.800	378.680
002426090006	851204.780	1009789.070	378.640
002426090007	851204.890	1009789.930	378.660
002426090008	851206.170	1009798.870	378.640
002426090009	851207.850	1009811.040	378.560
002426090010	851208.270	1009814.190	378.570
002426090011	851209.380	1009821.980	378.460
002426090012	851209.940	1009825.940	378.390
002426090013	851219.390	1009836.320	378.380
002426090014	851235.950	1009833.880	378.210
002426090015	851234.420	1009831.230	378.040
002426090016	851253.560	1009825.340	378.170
002426090017	851234.420	1009828.050	378.310
002426090018	851271.130	1009829.950	378.410
002426090019	851217.280	1009820.560	378.350
002426090020	851217.871	1009824.671	378.340
002426090021	851215.040	1009804.640	378.500
002426090022	851213.760	1009795.650	378.550
002426090023	851212.370	1009785.800	378.610
002426090024	851211.170	1009776.610	378.560
002426090025	851210.400	1009771.020	378.650
002426090026	851201.940	1009768.570	378.590
002426090027	851203.380	1009768.140	378.670

Příloha : grafická část bez měřítka



Předal:

Převzal: 24.10.2024

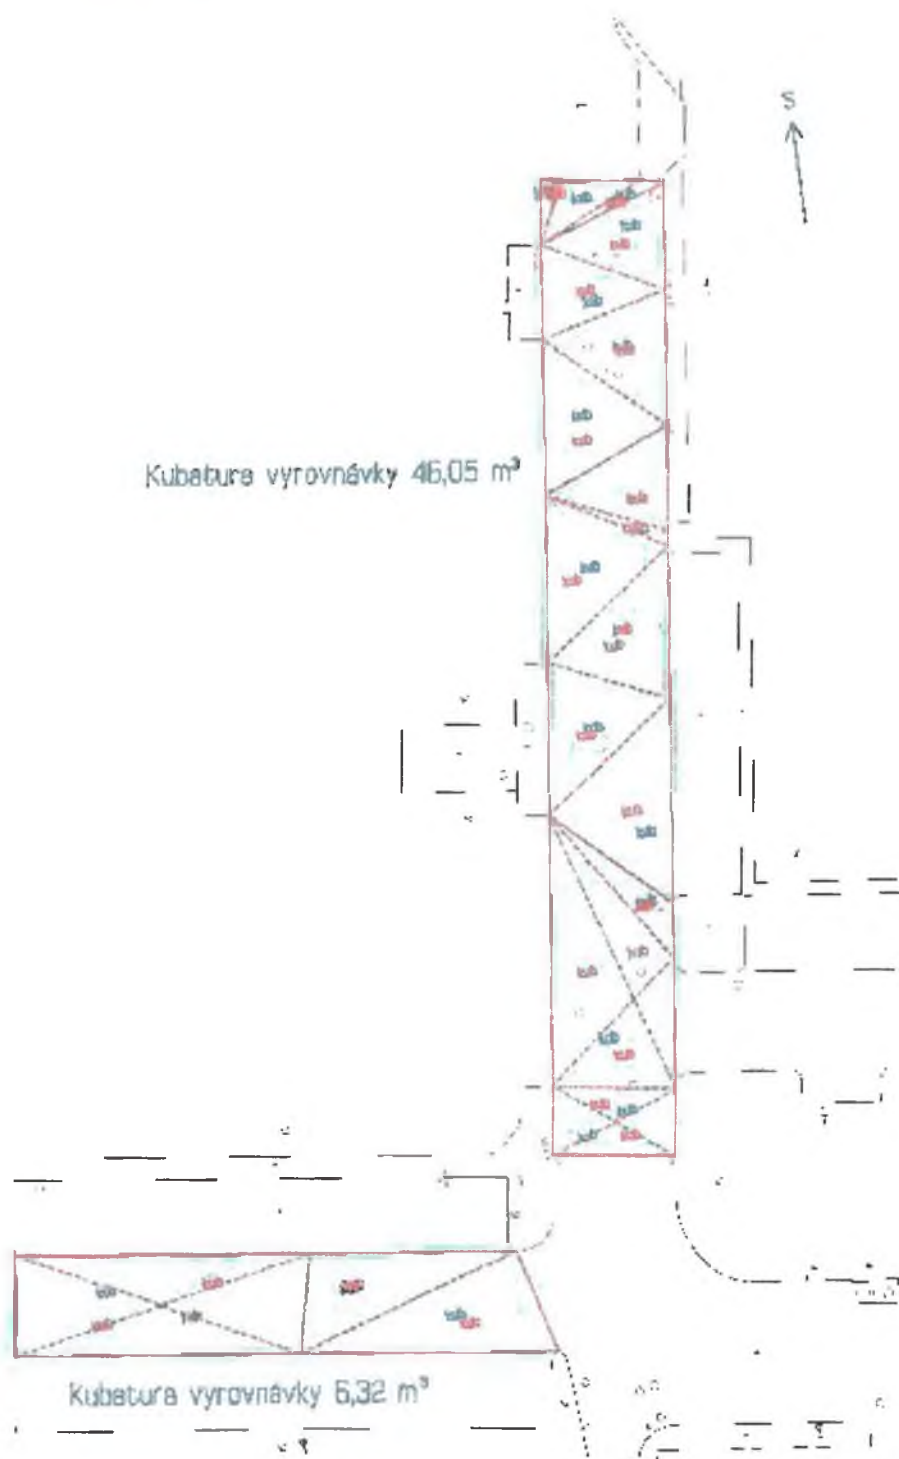

Požadavek zhotovitele na změnu č.13

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 11.11.2024

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“**Popis změny, technického řešení:**

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Dle PD

Nové řešení:
Skutečnost stavebních prací v návaznosti na projekt stavby

Zdůvodnění změny:
Skutečně provedené stavební práce

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ano

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Termín - žádný, Cena díla - dojde k ponížení ceny

Požadavek zhotovitele na změnu č.13

Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Datum: 11.11.2024

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) k předložené změně nemá další význam

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:



Ocenění ke změně č. 13
Projekt: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

číslo projektu: 2024-00014/ORI

ocenění číslo ke změně č./ze dne: 13

Název části stavby (stavební objekt): „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 11.11.2024

se odsouhlasuje změna:

Stavba: **Soupis provedených stavebních prací**
„Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Objekt:

0

Rozpočet

Změnový list č. 13 -
skutečnost, obrubníky, živ
plochy, dlažby

objekt	poř. č.	číslo položky	popis	m.j.	sklad.	sklad.	sklad.	sklad.
Asfalt	55	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABS) tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného	m2	65,00	650,00	-5,70	-3 705,00 Kč
Asfalt	56	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. 40 mm š. přes 3 m z	m2	1 220,00	400,00	-15,05	-3 020,00 Kč
	57	596211253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl. 60 mm pl. do 300 m2	m2	109,00	320,00	10,89	5 404,80 Kč
Mat	58	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	107,10	170,00	21,35	3 629,50 Kč
	60	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl. 80 mm skupiny A pl. do 50	m2	19,00	320,00	11,12	3 558,40 Kč
Mat	61	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	15,45	210,00	11,49	2 412,90 Kč
	63	596412213	Kladení dlažby z vybetónovaných tvárnice pozemních komunikací tl. 80 mm pl. přes 300 m2	m2	765,00	320,00	-23,72	-7 590,40 Kč
Mat	64	59245035	dlažba plošná betonová vybetónovaná 200x200x80mm přírodní	m2	727,20	370,00	24,23	2 965,10 Kč
Znač	94	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé tl. 125 mm bílý plast	m	252,00	250,00	-126,00	-31 500,00 Kč
Znač	95	915211111	Vodorovné dopravní značení přechodu pro chodce, šipky, symboly bílý plast	m2	4,50	350,00	-2,00	-700,00 Kč
Znač	96	915211115	Vodorovné dopravní značení přechodu pro chodce, šipky, symboly žlutý plast	m2	7,50	350,00	-3,00	-1 050,00 Kč
	97	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	543,00	320,00	19,17	6 205,40 Kč
Mat	98	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	535,50	135,00	-14,06	-1 979,10 Kč
	100	916331112	Osazení zabudovacího obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	181,00	320,00	-2,00	-3 100,80 Kč
Mat	101	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	183,60	75,00	10,00	817,50 Kč
	103	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrubníky z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,29	2 500,00	-0,66	-1 690,00 Kč
	125	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím z kamene, monolitickým betonovým	m	533,77	140,00	-7,843	-1 098,05 Kč
ZM13		59216010	vodič silniční betonové jednostranné průběžné 510x1000mm (včetně osazení)	m		4 810,00	4,810	19 260,00 Kč

	CELKEM	bez DPH	5 334,91		-40 160,75 Kč
	CELKEM	vč. DPH			-48 594,51 Kč

Datum:

Za zhotovitele:
Svatá Helena s.r.o.

V Karlových Varech

Projektant:

Objednatel:

TDI:

Evidenční list změny stavby

Název a číslo stavby: „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování” Název objektu:		číslo objektu/ číslo změny objektu:	číslo změny: Změnový list č. 13 - skutečnost, obrubníky, živ plochy, dlažba								
Obsah: Krycí list: <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div>Záznam o změně - počet stran A4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">4</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div>Grafické přílohy - počet stran A4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">1</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div>Další přílohy - počet stran A4</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">2</div> </div>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">číslo paré</th> <th style="width: 90%;">příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>		číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Projektant	3	Stavební dozor
číslo paré	příjemce										
1	Dodavatel										
2	Projektant										
3	Stavební dozor										
Iniciátor změny: Investor											
Popis a zdůvodnění změny: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 150px;"> <p>Změnový list řeší narovnání ploch na skutečně provedené stavební práce.</p> <p>Přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zápis o projednání soupisu prací a ceny objektu Položkový rozpočet dodatku a soupis prací vč. změn Doklady a vyjádření </div>											
Stavba celkem v Kč (bez DPH):											
Cena stavby dle smlouvy o dílo (bez rezervy)	Cena stavby dle předchozí změny	Cena navrhované změny	Nová cena stavby celkem	Celková změna +/- %							
6 817 625,36	6 783 433,73	-40 160,75	6 743 272,98	-1%							
Zhotovitel	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px;"></div>	datum									
Projektant (autorský dozor)	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px;"></div>	datum									
TDI stavby	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px;"></div>	datum Václav Vlček									
Objednatel	<div style="background-color: black; width: 150px; height: 20px;"></div>	datum									
Změny během výstavby - krycí list											

Street line s.r.o.

 Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014
 Telefon: Petr Hrdlický ZMČ.13 – skutečnost poklopy a značky Konečná ulice – K.Vary

Soupis provedených stavebních prací „Karlovy Vary, ulice Konečná – parkování“

Stavba:

Objekt:

Objekt:		Rozpočet		Změnový list č. 13 - skutečnost, obrubníky, živ- plochy, dlažby				
objekt	rozpočet	objekt	rozpočet	změna	nová cena			
Asfalt	55	57713111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABI) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	65,00	650,00	-5,70	3 705,00 Kč
Asfalt	56	57713121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š přes 3 m z	m2	1 270,00	400,00	-15,05	-6 020,01 Kč
	57	596211253	Kladení zámkové dlažby, komunikaci pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300 m2	m2	109,00	320,00	16,89	5 404,80 Kč
Mat	58	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	107,10	170,00	21,35	3 620,50 Kč
	60	596212240	Kladení zámkové dlažby, pozemních komunikací ručně tl 80 mm skruřinav A pl do 50	m2	19,00	320,00	11,12	3 558,40 Kč
Mat	61	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	15,45	210,00	11,49	2 412,90 Kč
	63	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvarů pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	765,00	320,00	-23,72	-7 590,40 Kč
Mat	64	59245035	dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní	m2	727,20	370,00	-24,23	8 965,40 Kč
Znač	94	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m2	252,00	250,00	-2,00	-31 500,00 Kč
Znač	95	915231111	Vodorovné dopravní značení přečechy pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	4,50	350,00	-3,00	-300,00 Kč
Znač	96	915231115	Vodorovné dopravní značení přečechy pro chodce, šípky, symboly žlutý plast	m2	7,50	350,00	19,47	-6 230,40 Kč
	97	916131213	Ozazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu	m	543,00	320,00	-14,66	-1 979,10 Kč
Mat	98	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	535,50	135,00	-9,69	-3 100,80 Kč
	100	916331112	Ozazení zabradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	181,00	320,00	-10,90	-817,50 Kč
Mat	101	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	183,60	75,00	-0,66	-1 650,00 Kč
	103	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obrub z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,29	2 500,00	-7,843	-1 098,05 Kč
	125	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s křivkem z kamene, monolitický betonový	t	533,77	140,00	4,00	19 240,00 Kč
ZM13		59216010	vozdítko silniční betonové jednostranné průběžné 510x1000mm (včetně osazení)	m		4 810,00		
		CELKEM	bez DPH		5 334,91			-40 160,75 Kč
		CELKEM	vč. DPH					-48 594,51 Kč


Datum:

Street line s.r.o.

Chodovská 315/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Plzeň, odd. C, vložka 25014

Telefon: [redacted] Petr Hladický ZM13 - skutečnost poklady o značce Konečná ulice - K. Vary

PROJEKT REKONSTRUKCE ULICE KONEČNÁ KARLOVY VARY

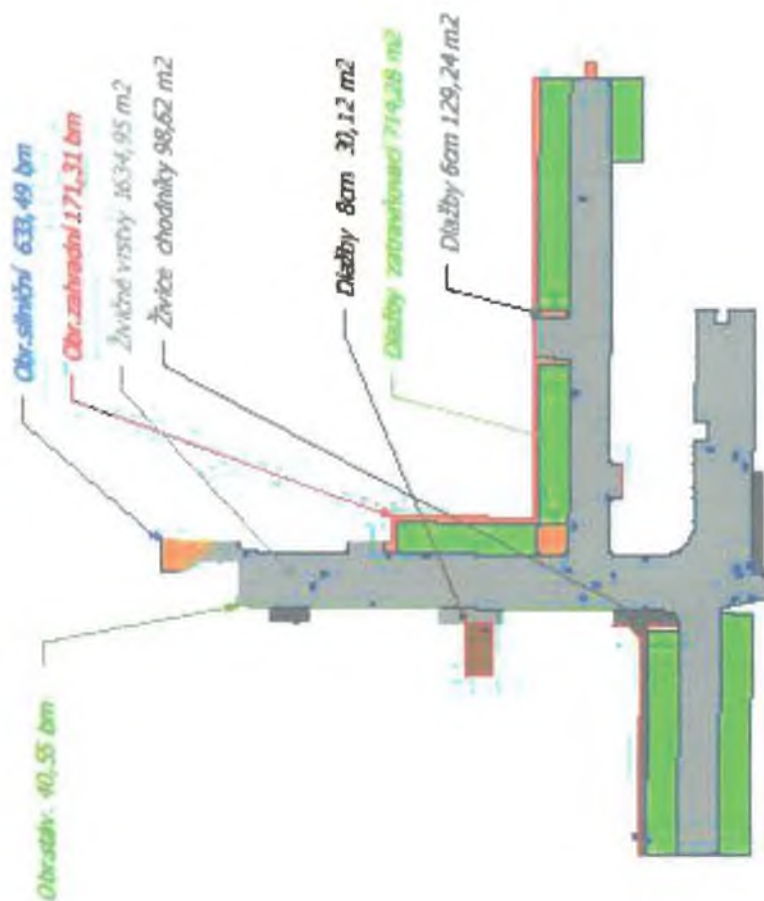

Street line s.r.o.

Chodovská 395/8 360 06 Karlovy Vary, IČO: 291 04 823, DIČ: CZ291 04 823, Registrováno u OR KS Píseň, odd. C, vložka 25014
 Petr Hudlický ZMLč.13 – skutečnost poklopy a značky Konečná ulice – K.Vary

Zakázka		Karlov Vary - parkování v ulici Konečná			
Reg. č. projektu					

Dod. č. ZL č.	SO - Popis a důvod změny	Změna závazku ze smlouvy § 222	Rozšíření	Zúžení	Hodnota změny	Hodnota změny max. 10/15 % odst. 4.	Cenový nárůst	Cenový nárůst max 30 % odst. 9
Původní hodnota závazku			6 817 625,36 Kč					
	Změna závazku dle odst. 4	4			336 684,00 Kč	4,94%	-224 584,00 Kč	
ZM1	Nerealizace oplocení				280 634,00 Kč	4,12%	-280 634,00 Kč	
ZM6	Bourání další části oplocení		56 050,00 Kč		56 050,00 Kč	0,82%	56 050,00 Kč	
	Změna závazku dle odst. 5	5			1 928 239,40 Kč		44 979,00 Kč	0,66%
ZM2	Zmenšení kubatury řezování			-98 334,00 Kč	98 334,00 Kč		-98 334,00 Kč	-1,44%
ZM3	Změna konstrukčních vrstev			-743 542,95 Kč	743 542,95 Kč		-743 542,95 Kč	-10,91%
ZM4	Drenáže		65 203,60 Kč		65 203,60 Kč		66 203,60 Kč	0,96%
ZM7	Plocha za trafostanicí		384 128,59 Kč		384 128,59 Kč		384 128,59 Kč	5,63%
ZM8	Vjezd na sousední plochu		24 862,35 Kč		24 862,35 Kč		24 862,35 Kč	0,36%
ZM9	Stabilizace		79 567,01 Kč		79 567,01 Kč		79 567,01 Kč	1,17%
ZM11	Skutečnost poklopy, SDZ			-59 592,50 Kč	59 592,50 Kč		-59 592,50 Kč	-0,87%
ZM12	Vyrovnávky		432 847,65 Kč		432 847,65 Kč		432 847,65 Kč	6,35%
ZM13	Skutečnost obruby, plochy dlažby, živice, VDZ			-40 160,75 Kč	40 160,75 Kč		-40 160,75 Kč	-0,59%
	Změna závazku dle odst. 6	6			105 252,62 Kč		105 252,62 Kč	1,54%
ZM5	Zvýšený rozsah betonu oplocení		68 135,20 Kč		68 135,20 Kč		68 135,20 Kč	1,00%
ZM10	Bourání betonu parkoviště osa3		37 117,42 Kč		37 117,42 Kč		37 117,42 Kč	0,54%
	Změna závazku dle odst. 5 a 6	5 a 6					150 231,62 Kč	2,20%
	Změna závazku dle odst. 7	7			0,00 Kč		0,00 Kč	
Nové hodnota závazku			6 743 272,98 Kč				-74 352,38 Kč	
